구분	전주 (5/15 ~ 5/19)	금주 (5/22 ~ 5/26)	비고
	■ 협의 항목	■ 협의 항목	
	- 23년 연간계획 협의사항 공유	- 23년 연간계획 협의사항 공유 안전 작업 허가서 발행 확인 :	
	- 사택 7동 지붕 도장 및 보수 하반기 검토=>(7동->5동->8동->9동->2동)	- 사택 7동 지붕 도장 및 보수 하반기 검토=>(<mark>7동</mark> ->5동->8동->9동->2동)	
	- 기숙사 및 사택 세대내 해충방제 특별방역 [6월/10월]_집 <mark>행 확정</mark>	- 기숙사 및 사택 세대내 해충방제 특별방역 [6월/10월]=>6월15(목)~16일(금)	
	- AB동 '21년 12월 침대 매트리 교체/ 3동 교체 X =>각 3세대 예상	- AB동 '21년 12월 침대 매트리 교체/ 3동 교체 X =>각 3세대 예상	
	기숙사동 침대 매트리스 케어 시연 _ 5월23일(화) , 13시00분	기숙사동 침대 매트리스 케어 시연 _ 5 <mark>월23일(화)</mark> , 13시00분	
	* 정기적인 청결 관리시 스프링 파손 또는 인의적 훼손이 없는 이상 교체 불필요	- 사택 어린이집 전열교환기 소자 및 미세먼지 필터 오염도 (하반기 계획 당김)	
	- 기숙사 및 사택 보안 사각지대 보안 카메라 추가 검토중	- 기숙사 및 사택 보안 사각지대 보안 카메라 화각 검토용 협의 [5/22]	
	① 네트워크 환경 개선 : UTP케이블 -> 광케이블	- 기숙사 및 사택 단지내 전기차 충전기 위치 확정후 AI뷰어 계획안 제출 [6/2] . 9동 기존 설치분 충전기 사용량 첨부	
	. 22년 화질개선(HD)에 따른 부분적으로 화면 버퍼링 현상 발생중	- 사택 5동 / 8동 / 9동 세대내 누수 보수 공가시 선대응 개선 검토중 [상반기]	
기숙사	② 기숙사동 보안 사각지대 다수 있음 : 보안 카메라 추가 위치 확인중	■ 5월 월 마감 서비스 엔트리 결재 상신 예정 목록	
	③ 전기차 충전기 화재감시 : 영상보안 AI뷰어 (클라우드,기본 약정 3년)	- PO 금액 : 79,391,925원 / PO건수 : 33건 (유첨 참조)	
/	. 별도의 카메라 설치 없이 기존 카메라 활용 가능함	■ PR발송	
사택	- 사택 5동 / 8동 / 9동 세대내 누수 보수 공가시 선대응 개선[상반기]	- 기숙사 3동 전기실 공통접지 보강 작업->4월3일 송부	
•	바닥난방 모듈 납품사 2개 협의완료 / 1개사 추가 발굴예정	- 기숙사 AB동 고장 보일러 교체 PR당사안 > 4월5일 송부	
	■ PR발송	- 사택 2-305 수장공사외 9건 PR당사안 송부->5월2일 송부	
	<mark>- 긴급 접수 필요 PR :</mark>	- 사택 외부계단 및 화단 경계벽돌 보수 PR당사안 송부-> 5월15일송부	
	① AB동 옥상방수(우기전)-> ② EHP세척(성수기 전)-> ③ 고장보일러 교체	│ │- 기숙사 및 사택 단지내 경차전용 표시외 9건 PR당사안 송부->5월17일송부	
	- 기숙사 3동 전기실 공통접지 보강 작업->4월3일 송부	- 기숙사동 및 공용부 EHP 오버홀 세척 제안 및 PR당사안->5월8일 송부	
	- 기숙사 AB동 고장 보일러 교체 PR당사안 > 4월5일 송부	- 기숙사 AB동 옥상 바닥 방수 보수외 3건 PR당사안 송부 ->5월12일 송부	
	- 사택 2-305 수장공사외 9건 PR당사안 송부 ->5월2일 송부	■ 공사 진행	
	■ 공사 진행		
	- 기숙사 3동 1층 아름누리 휴게실 외 4대 냉난방기 완료 [5/16~17일]	- 사택 8-109 수장공사외 5건 작업 [6/2]	
	- 기숙사 AB동 지하 기계실 급탕 순환펌프 누수 수리 점검 완료 [5/16]	- 사택 8-301 붙박이장 신규 설치 작업 [5/26]	
	- 사택 7-407 씽크대 씽크볼 교체 [5/15]	- 사택 어린이집 빗각세면대 및 파손 유리 교체 [6/3 ~ 4일]_주말작업	
			L


■ 사택 어린이집 전열교환기 전열소자 및 미세먼지 필터 오염도 현황



I. 현황 및 개선 검토

기숙사동 단지내 보안 사각지대의 CCTV 추가 및 시스템 개선을 통하여 보안 및 안전을 강화 하고자함.

□ CCTV 네크워크 환경_기존



L2 PoE: Layer 2 Power over Ethernet

□ 보안 사각지대(AB동기준층세대)_기존



□ 현황

번호	항목	현 황	비고		
1	네트워크 환경 버퍼링 현상	- 지속적인 화면의 끊김 현상 .'22년 카메라 일반화질에서 고화질로 변경			
2	보안 사각지대	- 음영 및 침입 지역에 카메라 미설치됨			
3	전기차 충전기 지역	- 9동 CCTV 충전기 2대분 지역 화재 관리 되지 않음 - 3동 뒷편 충전기 6대분 지역 화재관리 필요 (추가 예정)			

□ CCTV 네크워크 환경_개선 ___.:ITP 5



L3 PoE: Layer 2 Power over Ethernet


□ 보안 사각지대(AB동 기준층세대)_개선




□ 개선안 및 예상 비용


번호	항목	개선 내용	예상비용	비고
1	네트워크 환경 개선	- UTP 5e -> 광케이블 (데이터 선 변경) . 광케이블 : F/O Cable M/M 4Core - [L2 -> L3] / [L2 24Port -> L2 48Port]	-	L2: PoE S/W L3: PoE S/W
2	보안 사각지대	- 카메라 및 케이블 추가 설치 / 화각 조정 . 카메라: AB동 55개 / 3동 4개 추가	-	
3	전기차 충전기 지역	- 영상보안(AI뷰어) 적용으로 실시간 화재 감시 . 안전 관리자에게 화재시 실시간 전송	전기차 충전기 위치 확정후	기존 카메라 활용


유첨) 보안 사각지대 CCTV 배치 도면 (전,후)

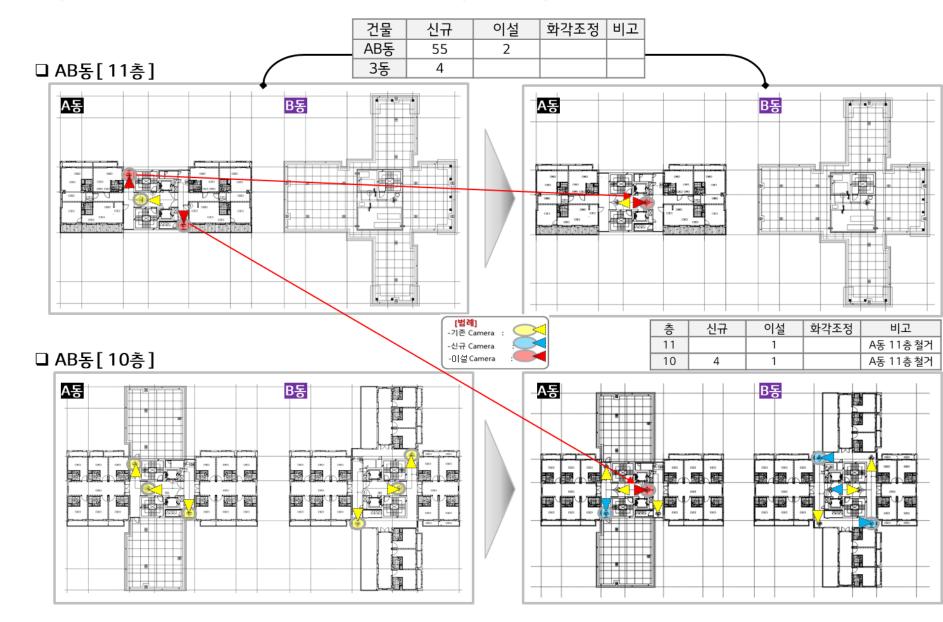

유첨) 보안 사각지대 CCTV 배치 도면 (전,후)

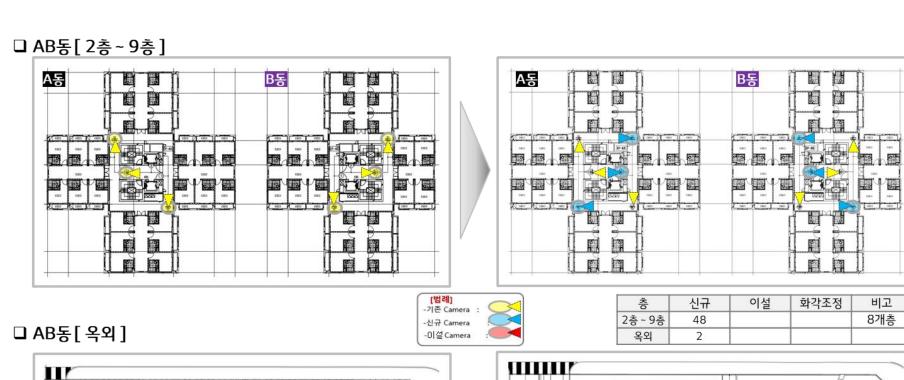







유첨) 보안 사각지대 CCTV 배치 도면 및 위치 사진 (전,후)

□ AB동 [지하 1층 (상/하)]





[범례] -기존 Camera	:	9	>
-신규 Camera		5	
-미설 Camera			3

층	신규	이설	화각조정	비고
지하 1층 (하)	1			
지하 1층 (상)				


□ 주요 설치 위치 사진


현장 사진			
내용	B동 지하1층 Carnera 설치위치	3동 지하1층 기계실 Camera 설치위치	외각동 입출차 Camera 설치위치
현장 사진			
내용	A,B동 총 관리실 Main S/W 설치위치	A,B동 3층 L2 S/W 설치위치	A,B동 7층 L2 S/W 설치위치

현장 사진			
내용	A,B동 11층 Camera 설치위치	A,B동 11층 Camera 설치위치	A,B동 10층 Camera 설치위치
현장 사진			
내용	AB동 10층 Camera 설치위치	A,B동 10층 Camera 설치위치	AB동 10층 Camera 설치위치

유첨) 보안 사각지대 CCTV 배치 도면 (전,후)

□ 3동[지상 1층 / 옥외]







□ 3동[지하1층]




층	신규	이설	화각조정	비고
1층 / 옥외	3			
지하 1층	1			





■ 단지내 전기차 충전기 설치 위치 검토



■ 단지내 전기차 충전기 위치 계획



■ 9동 : 현재 충전기 (2대분)



■ 3동 뒷편: 추가(6 대분)





- 주차장 면수에 따른 법정 요건 (도면기준), 유첨 참조
- 주차 면수: AB동(143대) + 1동 ~ 9동(226대) = 총 369대
- 설치 면수: 369대* 2%(법적 요율) =>7.38(8 대분) ※ 101동 ~ 104동: 100세대 미만에 따른 설치대상 제외

(1차전원 비용 상승, 전체전기다운 필요) 통전기 용량 및 개선 검토 (2 안) ** *** 정기 업체에서 검토 필요함.

■ 단지내 전기차 충전기 위치 계획



9동 (6라인 지상층): <mark>기존 설치 2대분 위치</mark>



■ 5동 (5라인-6라인지상층) : <mark>신규 2대분 위치 검토</mark>




■ 8동 (3라인 피로티또는 11라인지하층): 신규 2대분 위치 검토



■ 3동(지상층자전거보관소훼스측): 신규 2대분 위치 검.









'23년 5월 04 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 사택)

■ 5월 월 마감 서비스 엔트리 결재 상신 예정 목록

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					49,202,000	46,615,225	==>일성-일반(24 건)	-6%
					2,305,000	2,230,625	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					27,606,000	26,977,075	==>동운(7 건)	-2%
					5,034,000	3,569,000	==>하이엠솔루텍(1 건)	-41%
					84,147,000	79,391,925	5월 마감건(33 건)	-6%
01	05월31일	기숙사 3동 기계실 급탕탱크용 배관 누수 보수		2023-05-08	535,000	518,150	동운	-3%
02	05월31일	기숙사 AB동 지하 주차장 자동문 보수	현장 용접 에서 공장 용접으로 변경에 따른 보양삭제(10m2)	2023-04-06	1,900,000	1,430,825	일성건축	-33%
03	05월31일	사택 5-505 앞베란다 창호용 방충망 교체		2023-04-04	292,000	281,650	일성건축	-4%
04	05월31일	사택 7-301 외벽세대 단열작업		2023-04-18	4,390,000	4,257,000	일성건축	-3%
05	05월31일	사택 101-103 UBR 욕조 누수보수	노무비 직종 변경 (방수공->보통인부)	2023-04-17	849,000	770,775	일성건축	-10%
06	05월31일	기숙사 A동 304-1호 도배보수의 5건		2023-04-19	3,785,000	3,679,725	일성건축	-3%
07	05월31일	사택 8-109 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2023-05-09	711,000	731,000	동운	3%
80	05월31일	사택 어린이집 전열교환기 전열소자 교체	주말 노무비 할증 미적용(합의)	2023-04-13	5,034,000	3,569,000	하이엠솔루텍	-41%
09	05월31일	기숙사 B동 702-5호 도배보수외 1건		2023-04-19	752,000	724,550	일성건축	-4%
10	05월31일	사택 102-401 단열작업		2023-04-06	1,967,000	1,907,050	일성건축	-3%
11	05월31일	사택 102-401 수장공사		2023-04-25	4,588,000	4,447,275	일성건축	-3%
12	05월31일	기숙사 3동 204호 도배보수		2023-04-19	572,000	552,550	일성건축	-4%
13	05월31일	사택 9-305 누수 난방분배기 교체		2023-05-09	327,000	325,725	동운	-0.4%
14	05월31일	사택 7-301 LED등기구 교체		2023-04-30	1,002,000	975,025	대양이엔씨	-3%
15	05월31일	사택 9-505 안방 단열작업		2023-03-30	917,000	886,875	일성건축	-3%
16	05월31일	사택 8-508 방충망교체 및 뒷베란다 도장		2023-04-07	292,000	281,650	일성건축	-4%
17	05월31일	사택 102-401 베란다 누수보수(전면)		2023-04-21	946,000	915,900	일성건축	-3%
18	05월31일	기숙사 3동 급탕탱크용 보급수배관 누수			1,270,000	1,237,325	일성건축	-3%
19	05월31일	기숙사 B동 604-2호 도배보수외 2건		2023-04-25	2,598,000	2,518,725	일성건축	-3%
20	05월31일	사택 9-404 앞베란다 방충망틀 교체		2023-04-19	458,000	452,575	일성건축	-1%
21	05월31일	기숙사 3동 기계실 노후 급수용 펌프 교체		2023-04-21	13,406,000	13,226,750	동운	-1%
22	05월31일	기숙사 3동 지하기계실 저수조 개선작업		2023-04-26	6,088,000	5,894,225	동운	-3%
23	05월31일	기숙사 3동 230호 도어보수의 3건		2023-04-27	1,926,000	1,861,900	일성건축	-3%
24	05월31일	기숙사 3동 아름누리 휴게실 방충망 교체	(알루미늄창호 설치+ 보통2인)-> (특별1인+보통1인) 최소인건비로 변경	2023-04-25	563,000	452,575	일성건축	-24%
25	05월31일	기숙사 AB동 1층 관리소 외벽 누수 보수		2023-05-03	1,810,000	1,686,675	일성건축	-7%
26	05월31일	기숙사 A동 304-3호 도배보수의 7건		2023-04-27	4,572,000	4,427,925	일성건축	-3%
27	05월31일	사택 5-506 앞베란다 타일 교체작업	사다리차(폐기물) 1일사용->반일 사용으로 변경	2023-05-17	4,056,000	3,678,650	일성건축	-10%
28	05월31일	사택 8-109 수장공사		2023-05-23	5,690,000	5,522,275	일성건축	-3%
29	05월31일	사택 어린이집 배수동수 및 관로촬영 작업		2023-05-13	5,394,000	5,154,625	동운	-5%
30	05월31일	사택 8동 6-8라인 지붕 환기휀 및 누수보수		2023-04-28	3,986,000	3,643,175	일성건축	-9%
31	05월31일	사택 8-310외 1세대 누수 난방분배기 교체		2023-05-09	1,145,000	1,126,600	동운	-2%
32	05월31일	사택 7-407 씽크대 씽크볼 교체		2023-05-20	544,000	535,350	일성건축	-2%
33	05월31일	사택 9-101 작은방 천정보수		2023-05-08	479,000	462,250	일성건축	-4%
34	05월31일	기숙사 3동 1층 아름누리 휴게실 냉난방기 교체		2023-05-19	4,841,000	4,622,500	에어컨특판	-5%
35	05월31일	기숙사 3동 지하 용역원실 냉난방기 설치		2023-05-19	10,590,000	10,120,000	에어컨특판	-5%
36	05월31일	임차사택 수장공사 박민수(cell선행)		2023-04-21	2,305,000	2,230,625	일성건축	-3%

■ PR발송 목록 5월2일

2章:	계약명	PR 당사안	작업내용
01	기숙사 B동 604~2호 도배보수의 5건	4,521,000	IS 600-C: 도비에(전원), (본) 취정실)꾼끝을 보수 IS 700-C: 도비에(지) 보수 ISF 700-C: 도비에(지) 비디오 크레, 문광립(여장실) 보수 ISF 700-C: 도비에(지), 방교니 경례생인이 조정 보수 ISF 900-C: 도비에(지), 방교보 점계 모수 ISF 900-C: 도비에(지) 방교보를 보수
02	사택 2-305 수정공사	3,684,000	도배(역-거실, 방군쥐), 장판(거실, 방군지), 모색(문, 문름(방군곳, 뒤매탄다1곳), 방화문(의부,내부), 앞,뒤메란다 전부), 뒤베란다 벽단열계 등등 및 그럭 선제포수,모일러 언흥 내열실리콘 모수, 기실 내부사시 방충망(가게교체, 양메란다 외부사사청관 시트지 제거, 주방 사시청준 시트지제거, 문화품(메랜만드는 건), 모수
03	사택 2동 공동현관 도어보수 및 캐노피 도장작업	1,456,000	 ① 1층 공동현관 강화도어 한지 교체 보수 ~3,4라인 좌,우측문 : 상,하한지(2set), 우측 문틀 실리콘 코킹 ② 1층 공동현관 캐노피 도색 보수(4개라인 4곳)
04	사택 7동옆 어린이 놀이터 놀이기구 교체	4,241,000	어린이 놀이터 시설물 시소 스프링 탈락 및 부식으로 교체
05	사택 8~109의 1세대 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	1,225,000	8-109: 누수 난방분배기 교체(5구 1대) / 기존 난방분배기 철거 쓍크대 수전 철거후 임수전 배관으로 재구성 작업 8-205: 누수 난방분배기 교체(5구 1대) / 기존 난방분배기 철거 쓍크대 수전 철거후 임수전 배관으로 재구성 작업
06	사택 8-205 수장공사	5,287,000	도배(박-거실,방3곳), 도배(천정-거실,방3개), 장판(거실,방3곳), 도색(문,문틀-방3곳, 방화문내부, 앞,뒤베란다전부, 거실 켤레받이), 앞베란다 방충망(1개)교체, 문끌림(뒤베란다 참고문) 보수
07	사택 8-205 씽크대 철거 타일 붙임후 재설치	824,000	기존 씽크대 임시 월거 작업 타일백 설치 완료후 씽크대 재설치 작업
08	사택 8-205 주방벽 철거 및 타일교체	1,325,000	기존 석고보드 주방백 철거 작업 주방벽 타일 설치 작업
09	사택 101동 및 102동 옥상 철구조물 지주 보수작업	5,155,000	옥상 철구조물 하부기초 부분 크랙 및 파손으로 보강 작업 101동: 2개소/102동: 3개소 (합계: 5개소)
10	사택 101동 주차장 바닥 애폭시라이닝 부분보수	3,697,000	101동 지하 1층 주차장 바닥이 보수 작업 3,4라인알 주차라인 안목~ 1 / 3,4라인알 주차라인 안목~2 /3,4라인 알 통 5 1,2라인~3,4러인 알 통로 7 / 2라인 알 통로 7,2라인 알 주차라인 안목~1 1,2라인 알 주차라인 안목~2 / 1,2라인 주차라인 안목~3
	소계	31,415,000	

■ PR발송 목록 5월12일

번호:	계약명	PR 당사안	작업내용
01	기숙사 AB동 옥상 졸눈 코킹 및 B동 옥상 크랙보수	19,180,000	A동: 옥상 바닥 줄눈 코킹 작업 B동: 옥상 바닥 크랙 보수 및 줄눈 코킹 작업
02	기숙사 3동 421호 소음개선작업(벽 전체도배)	2,341,000	차음시트(3T) + 석고보드(차음 12.5T) 설치 작업 천정 몰딩 및 바닥 걸레받이 철거 및 설치 작업 벽 전체 도배 작업
03	기숙사 A동 204-3호 도배보수의 3건	2,436,000	A204-3: 벽도배 및 블라인드(버티컬) 설치 A401-3: 화장실 도어보수 작업 A604-4: 벽도배 작업
04	사택 5동 경비실 주차 차단기 비상 전원 스위치 설치	2,676,000	사택 5동 경비실내 주차 차단기 비상전원 버튼 설치 주차 차단기 (기숙사동)와 연결 랜선 포설
	소계	26,633,000	

■ PR발송 목록 5월17일

변호	계약명	PR 당사안	작업내용	비고
01	기숙사 3동 214호 도배보수	571,000	백 도배 및 준공청소 작업	
02	기숙사 A등 301-6호 도배보수의 1건	1,557,000	A301-6 : 벽도배 작업 B803-4 : 벽 및 천장 도배 작업 블라인(버티컬) 교체	
03	사택 2-202 수장공사	5,348,000	도배변 가실, 방오곳), 도메(현장 가실, 방2곳), 장면가실, 방2곳, 도메(현장 가실, 방화로 내부, 앞, 뒤메란다 전부), 뒤메란다 면단열재 그려 전체보우, 뒤메란다 바닥만을 중보수, 방송항교체 4곳(앱메란다(2개),테메란다(1개), 중간사시(1개), 셈크대 상,하문짝 전체교체, 생크대 수전원교교체, 문필권 1곳(데메란다)로), 가실우주항 (연제품들 누수확인 및 보수	
04	사택 8-303 누수 난방분배기 교체	1,248,000	기존 씽크대 임시 분해 및 완료후 원복 작업 기존 누수 난방분배기 철거 작업 신규 난방분배기 설치 작업(5구)	
05	사택 8-303 수장공사	5,340,000	도배(해'-거실, 방3곳), 도배(천정-거실, 방3곳), 장판(건설, 방3곳), 도색(윤, 문플-망)곳, 방화론내부, 앞,뒤베란다전부, 거실 걸레받이), 화장실 착측방 백체들탐보수, 앞베란다 방충일(1개교육, 문골광-2곳(여유문학, 화작실작축사망, 방래건조대(참/개없음)교체	
06	사택 9-304 수장공사	4,933,000	도배(백-거실,방3곳), 도배(천정-거실,방3곳), 장판(거실,방3곳), 도색(문,문플-방3곳, 방화문내부, 수도계량기함, 앞,뒤베란다전부, 거실걸레받이) 작업	
07	사택 103-305 UBR 욕조 누수보수	849,000	기존 누수 욕조 임시 철거 작업 욕조 배수구 교체 및 배수구 하부 보수 작업	
08	사택 103-305 단열작업	1,482,000	주방(작측방,우측방-2개소)창문쪽벽면 누수 점검 기존 들뜸 단열째 철거 작업 신규 단열째(단열시트 + 이보드) 설치 작업	
09	사택 103-305 수장공사	5,716,000	도폐변~기실, 방3곳), 도폐(천정~기실, 방3곳), 장판(가실, 방3곳), 도희(열,뒤해면다 전부), 주방(작동병,우축방~2개소)참문쪽 백면 누수확인 및 단열제시공. 연방왕을 시트지세기, 주방작측방 방송(양(개체기, 거실 및 주방우주왕 경희왕(연구), 작업	
10	기숙사 및 사택 단지내 경차전용 표시 작업	5,345,000	-시택(101등-104등) 8개소(지하 1층 2개소, 지하 2층 6개소) -시택 9등 7개소 -기숙사 ABS 12개소(지상 1, 지하 1층 5, 지하 2층 6개소) -기존 표시 라인 지우기 7개소(6등 3개소, 7등 3개소, 9등 1개소)	
	소계	32,389,000		

■ '23년 연간계획 진행현황

NO.	구분	공사명	제안서 필요 _▼	견적 유/무 _{↓↑}	PR당사안 제출 _▼	검토			
19	수선	사택 101-104동 옥상 방수 보수				부분보수			
20	수선	사택 101동-104동 지하 주차장 환경개선 공사	•			부분보수			
16	수선	사택(1동-9동)외부 경계면 휀스 교체 작업				부분교체			
25	수선	기숙사 출입구 출구측 차단기옆 가스배관 맨홀 침하 보수							
14	수선	사택 단지내 아스팔트 노면 보수				도로 훼손			
15	수선	사택 6동 및 7동 전후면 바닥 보도블럭 개선							
17	수선	사택 현관 출입구 계단 교체							
31	수선	기숙사 AB동 지하 주차장 LED디밍센서등 설치		_					
32	수선	기숙사 3동 전기실 접지 개선 작업	R제출	•		굴착 최소			
4	투자	기숙사 AB동 및 3동 보안 사각지대 개선	•			동별 분리 PR작성			

NO.	구분	공사명▼	제안서 필요 ~	견적 유/무 _{↓↑}	PR당사안 제출 _▼	검토
2	투자	기숙사 및 사택 전기차 총전기	•	•		중전기 장 비 MRO 또는 수선공사
5	투자	기숙사 AB동 지하기계실 노후 진공온수 보일러 교체	R제출	•		고장 1대분 만 교체
24	수선	기숙사 3동 용역원실 및 시설 관리원실 PF 냉난방기 설치	 			
26	수선	사택 어린이집 전열교환기 필터 및 전열소자 교체	PR접	수		4월 / 9월 (상,하반기)
27	수선	기숙사 AB동 세대별 화재감지기 선로 개선	Prop	•		
28	수선	사택 1동 , 7동 비상방송 공사				
29	수선	기숙사 AB동 공동현관 자동문 개선				
1	투자	기숙사 AB동 체력 단련실 런닝머신 6대 신규 설치		•		MRO 또는 수선공사
30	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(소방)		•		
34	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(전기)				
21	수선	기숙사 AB동 옥상 방수 보수		•		부분 보수
18	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(건축)		•		
3	투자	기숙사 및 사택 전기차 충전소 1차 전원포설 작업				충전기 장비용 1차 전원 공사
23	수선	기숙사 3동 지하 저수조 볼탑설치	_ 종료 	•		
22	수선	기숙사 3동 부스터 펌프 교체	_ 종료 	•	0	
33	수선	사택 7동 세대내 LED등 교체	l R접수 I	•	0	
